


# Bericht des Vorstands

Sachstand KWH Neubau / Dachsanierung der enni.eventhalle

Verwaltungsratssitzung am 28.09.2021

# Kreislaufwirtschaftshof

- Bauantragsunterlagen nebst sämtlicher Gutachten fertig gestellt
- Übergabe Bauantrag an die Bezirksregierung in 39. KW; von dort Weiterleitung an die Stadt
- Ausschreibungsunterlagen fertig gestellt und durch Fachanwalt für Vergaberecht freigegeben
- Vorgesehener Baubeginn: August 2022
- Risiko: Baupreisentwicklung / Kostensteigerung gegenüber dem Planansatz von 8,3 Mio. €

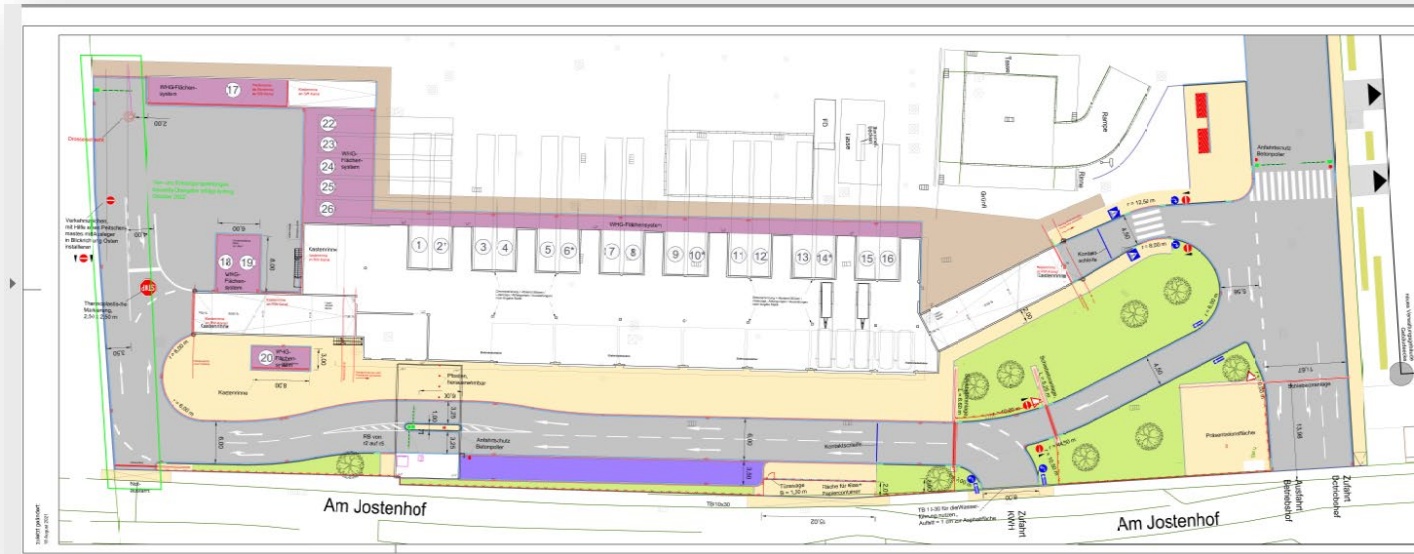

# enni.eventhalle

- Erstellung der ca. 3.900 m<sup>2</sup> großen Dachhaut aus gefalzten Aluminiumblechen abgeschlossen; hierdurch keine Einschränkungen für die Hallennutzung (z.B. Auslastung Traversen für Licht oder Ton)
- Verbesserung der Wärmedämmung und Reduzierung der Geräuschemissionen
- Abdichtung der östlichen Stirnfassade voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen



Zustand vor der Sanierung



Zustand nach der Sanierung
