

# Bericht des Vorstands

Stand Innenstadtsanierung | Baumaßnahme Burgstraße

Verwaltungsratssitzung am 29. September 2022


# Projektstand Innenstadtsanierung

## Abgeschlossen

- Kooperationsvertrag zw. ENNI und Stadt Moers abgeschlossen (u.a. Kostenschlüssel, Aufgabenzuordnung, Pflichten, Vergaberegularien)
- Vergabeunterlagen Planungsleistung der Hauptmaßnahme fertiggestellt.


## Laufende Maßnahmen

- EU-Ausschreibung zur Planungsleistung der Hauptmaßnahme gestartet. Teilnahmeanträge bis 17.10.2022, Angebote 3.2.2023, Vergabe 25.2.2023
- 1.630 Meter Kanalsanierung auf Haagstr., Im Rosenthal, Fieselstr., Kastell, Kleine Allee, Burgstr. und Oberwallstr. in geschlossener Bauweise im Inlinerverfahren sowie 350 Grundstückanschlussleitungen - Start 19.9.2022

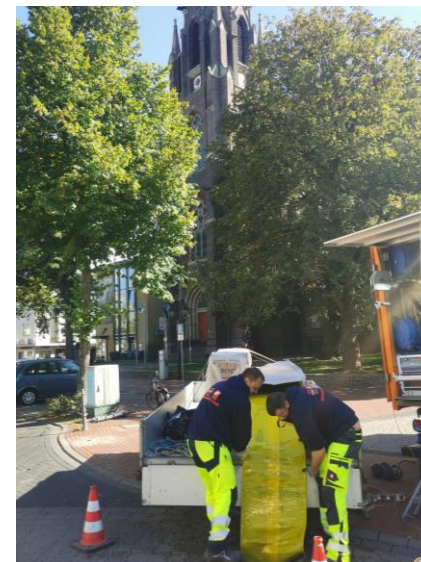

## In Arbeit / folgende Schritte

- Aufbau der EU-Ausschreibung des Kommunikationskonzeptes bis Ende Q4/2022

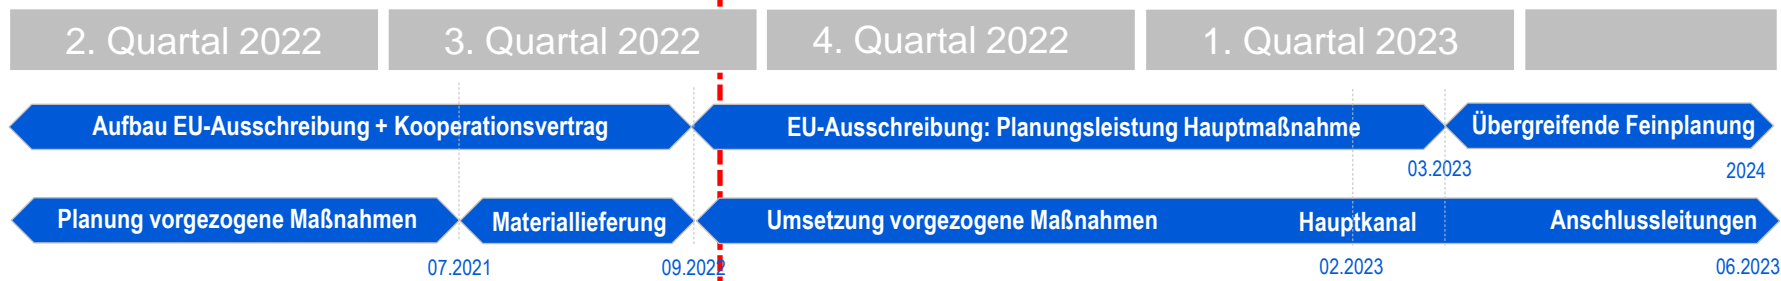

# Baumaßnahme Burgstraße

## Bau von 4 Fernwärmeanschlüssen durch Fernwärme Niederrhein


- Rund 45 Meter Tiefbau bei Straßenbreite (Haus / Haus) von rund 5-7 Meter

## Mitverlegung / Vorgezogene Maßnahmen enni


- Erneuerung des Gas-, Wasser- und Stromnetzes sowie ca. 17 Kanalananschlüsse, Neuverlegung von LWL Leerrohrsystem
- Kanalsanierung im Inlinerverfahren

## Präzedenzfall für Innenstadtsanierung

- Baufeld max. 15 Meter aufgrund eingeschränkter Rettungsmöglichkeiten
- Zeitliche Abstimmung zum Weihnachtsmarkt mit Verkehrsbehörde
- Öffentlichkeitsarbeit aufgrund eingeschränkter Zugänglichkeit zu Geschäften
- Logistik und Lagerflächen über/auf Haagstraße
- Nach Abschluss ist Burgstraße Ver- und Entsorgungsseitig 100% saniert

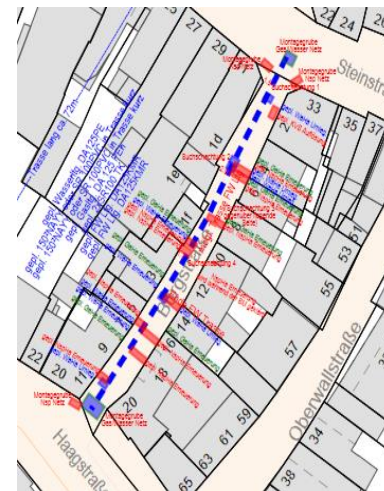

## Zeitplan:



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**
